



Региональный проектный офис
Минэкономразвития НСО

Организация проектной деятельности в Правительстве Новосибирской области

Молчанова Ольга Витальевна —
заместитель Председатель Правительства
Новосибирской области — министр
экономического развития
Новосибирской области



Постановление Правительства РФ «Об организации проектной деятельности в Правительстве РФ» от 15.10.2016 № 1050:

2. Рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ организовать проектную деятельность, руководствуясь Положением, утвержденным настоящим постановлением.

ПРЕДПОСЫЛКИ

реализуются не самые приоритетные проекты

не достигаются цели, не выполняются ключевые показатели

не соблюдаются сроки и бюджеты проектов

неэффективное использование ресурсов
(человеческих, материальных)

неэффективное межведомственное взаимодействие, недостаток мотивации

нестабильность политического и экономического окружения



ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1

Концентрация на результате, а не процессе

2

Единые увязанные цели и приоритеты

3

Упрощенная система согласования

4

Встраивание в федеральную систему

5

Персональная ответственность и мотивация

6

Объективный ИТ мониторинг

7

Проактивное управление рисками и возможностями



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ РФ





НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ


Положение о проектной деятельности



План мероприятий



Методические рекомендации по подготовке паспортов проектов, программ и проектных предложений





СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НСО

Организационный штаб

Знатков В.М.

Региональный проектный офис

Молчанова О.В.

Проектные офисы по приоритетным направлениям стратегического развития РФ

Здравоохранение

Титков А.П.

Образование

Титков А.П.

Экология

Пронькин В.А.

Моногорода

Никонов В.А.

ЖКХ и городская среда

Сёмка С.Н.

Ипотека и арендное жильё

Боярский С.В.

Безопасные и качественные дороги

Титов С.М.

Производительность труда

Шмидт И.В.

Международная кооперация и экспорт

Сёмка С.Н.

Реформа контрольной и надзорной деятельности

Вязовых В.А.

Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы

Сёмка С.Н.

Проектные офисы по дополнительным приоритетным направлениям стратегического развития НСО

Программа реиндустриализации экономики НСО

Соболев А.К.

АПК

Пронькин В.А.

«Дорожная карта» по улучшению показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в НСО

Молчанова О.В.



СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НСО

Организационный штаб

Региональный проектный офис

Проектный офис по
приоритетному направлению

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Проектный офис по
приоритетному направлению

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Проектный офис по
приоритетному направлению

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту

Рабочая группа по проекту




РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТНЫЙ ОФИС

Основные функции регионального проектного офиса:

- координация, контроль и мониторинг проектной деятельности
- обеспечение формирования и ведения портфеля приоритетных проектов (программ)
- обеспечение методического сопровождения проектной деятельности
- организация обучения участников проектной деятельности
- взаимодействие с федеральным проектным офисом
- оценка итогов реализации приоритетных проектов (программ), подготовка соответствующих рекомендаций и предложений
- осуществление мониторинга внедрения и функционирования системы управления проектной деятельностью



СХЕМА МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ

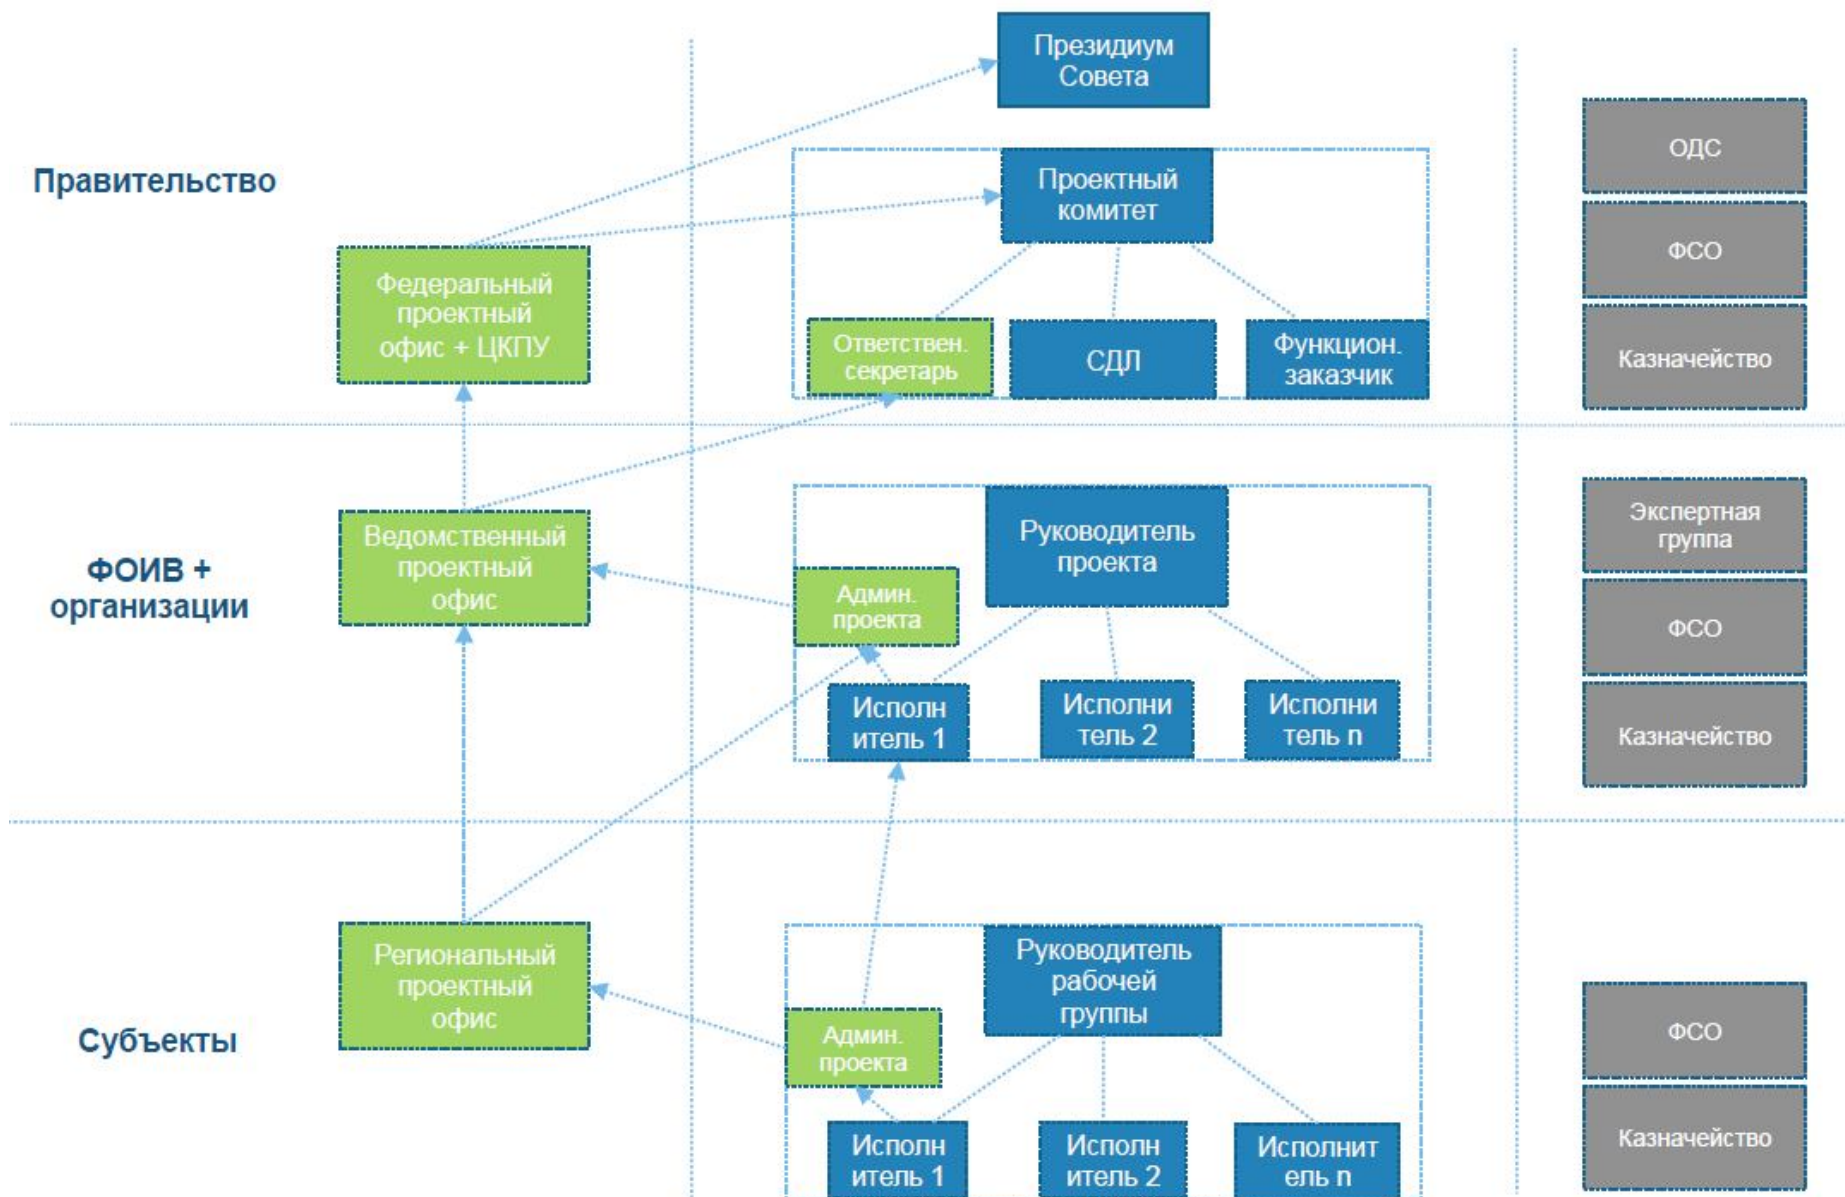



ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


Субъекты управления



Процессы управления



Объекты управления

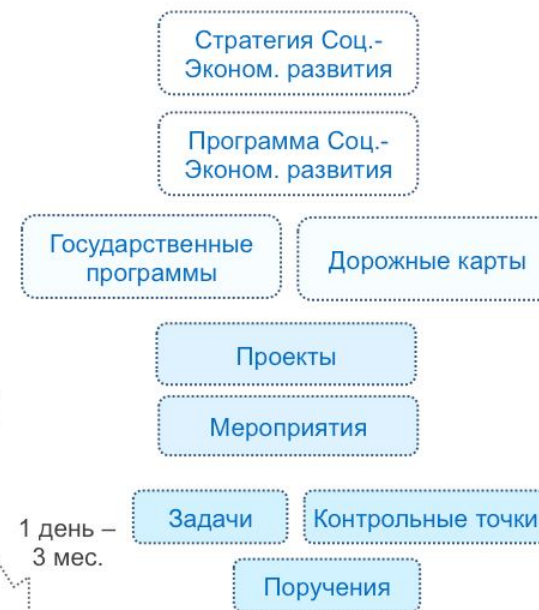



РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НСО

1 Этап - обучение основам проектной деятельности

Январь 2017

Семинары для руководителей – 20 человек, 2 академических часа
Семинары для сотрудников и руководителей – 40 человек,
6 академических часов

2 Этап - анализ действующей административной системы управления

Февраль 2017

3 Этап - разработка концепции проектной деятельности в НСО

Март 2017

4 Этап - разработка системы НПА проектной деятельности в НСО

Апрель 2017

5 Этап - обучение работе в системе проектной деятельности НСО

Май 2017

Семинары для руководителей – 20 человек, 2 академических часа
Семинары для сотрудников и руководителей – 40 человек,
6 академических часов

6 Этап - внедрение системы проектной деятельности НСО

Декабрь 2017



ПРОЕКТ РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА НСО

Минэкономразвития НСО

В срок до 01.07.2017 организовать внедрение проектной деятельности в областных исполнительных органах государственной власти Новосибирской области

ДИРТТ НСО совместно с Минэкономразвития НСО


В срок до 01.08.2017 подготовить предложения по разработке автоматизированной информационной системы проектной деятельности

Департаменту организации управления и государственной службы

В срок до 01.08.2017 подготовить предложения по системе мотивации сотрудников областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области за участие в проектной деятельности



Региональный проектный офис Минэкономразвития НСО

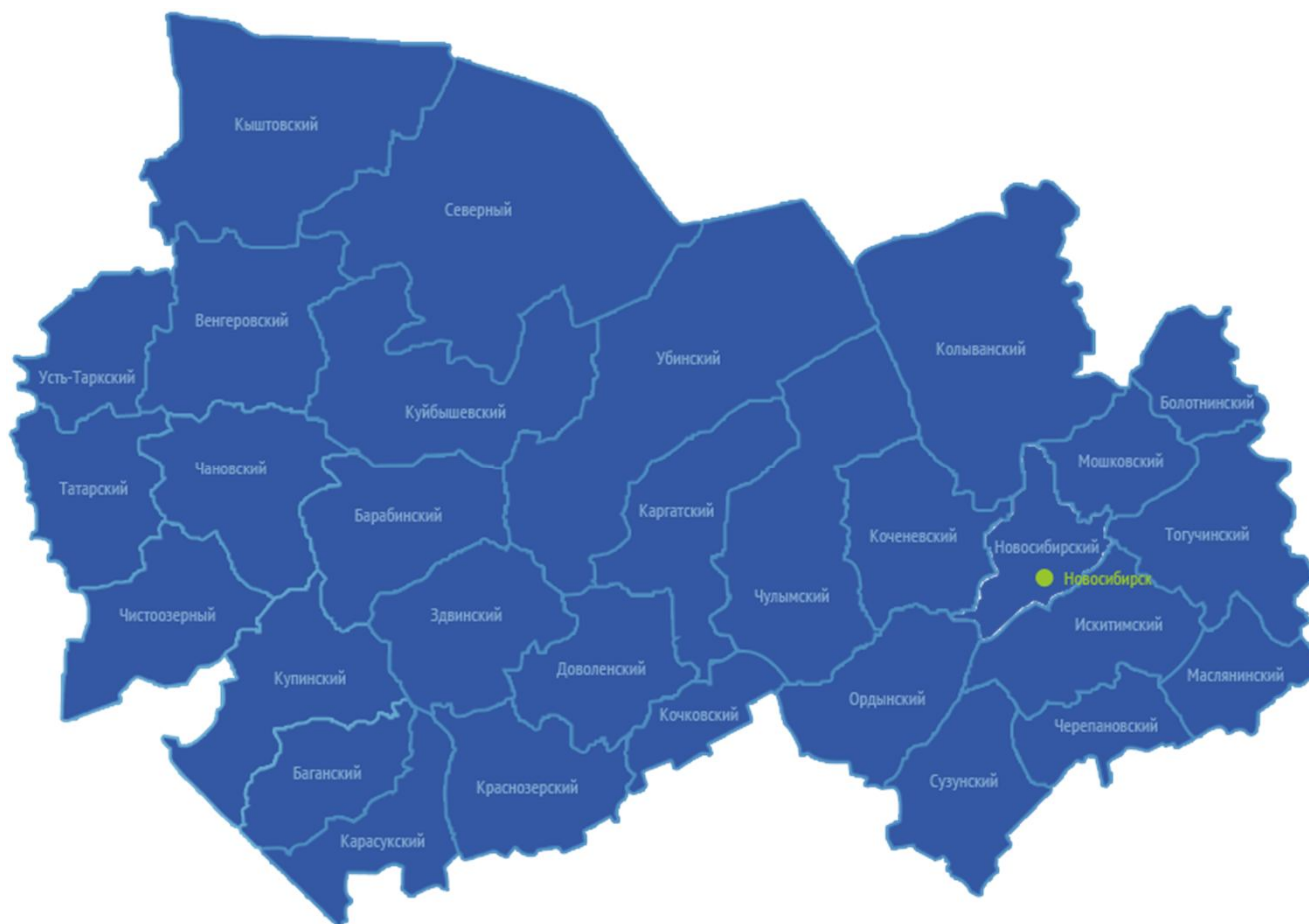

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
